



Subsecretaria de Projetos para Reconstrução
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

RELATÓRIO DE VISTORIA

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação: DFCR-RSM-RV-156-2024	Data da Vistoria: 13/11/2024
	Data do Relatório de Vistoria: 18/11/2024
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT N° 20/2021 – EDITAL CRI n° 0001/2020.	
Objeto do Contrato: concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabaí – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54).	
Concessionária: Rota de Santa Maria – RSM.	
Assunto: vistoria técnica em campo.	
Referência: PROA n° 24/0400-0000970-9.	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- a) Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada em campo pela SERG/SPR/DFCR, na data de 13 de novembro de 2024. A vistoria foi efetuada pelas servidoras Gracieli Borré e Márcia Roseli Gaber;
- b) As obras e serviços vistoriados e indicados neste relatório são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021, relativo ao Edital CRI n° 0001/2020;
- c) O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do Item 3.1 do PER – Obrigações de Recuperação e Manutenção, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- d) O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 assinala que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- e) O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- a) Na data da vistoria, foram percorridos 204,51 km da RSC-287 concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabaí/RS e Santa Maria/RS. No trajeto, foram realizadas paradas para





inspeção das condições do Pavimento, da Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, da Faixa de Domínio e das Instalações de Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU);


- b) Para registro dos fatos, bem como para mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e as disposições contratuais e do PER;
- a) Os IDs 36, 37 e 43 demonstram que a cor amarela da Sinalização Horizontal está em desacordo das especificações do Volume IV – Manual de Sinalização Horizontal-2022 – CONTRAN, página 10, item 3.4.2;
- b) Os IDs 06, 07, 10, 11, 25 e 26 indicam que o tipo de letras/números das legendas está em desacordo das especificações do Volume IV – Manual de Sinalização Horizontal-2022 – CONTRAN, 126 a 129 apêndice Alfabeto Série D – Legenda de Solo;
- c) Recomenda-se a avaliação do comportamento das entradas e saídas dos desvios. Observou-se que a geometria projetada para redução de velocidade não está sendo respeitada. Além disso, não foram encontradas placas de velocidade máxima (R-19) nas proximidades dos desvios ou no segmento, o que prejudica a percepção dos condutores sobre o tipo e as condições do trajeto a ser percorrido;
- d) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária, com exceção de painelas, que é de 24 horas;
- e) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária;
- f) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária;
- g) O prazo de atendimento, em caso de não conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- h) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a Concessionária.

Este é o relatório,

Eng.^a Civil MSc. Gracieli Borré
Divisão de Fiscalização de Investimentos e Segurança Viária






GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA

Arq.^a e Urbanista Márcia Roseli Gaber
Divisão de Fiscalização de Investimentos e Segurança Viária

Eng.^a Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos
Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias



Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3288-1155 | dfcr@serg.rs.gov.br



ANEXO I - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	062+790	Crescente	72 horas
02			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	062+810	Decrescente	72 horas
03			Sinalização Vertical – Substrato danificado Item 3.1.2 do PER	065+860	Crescente	72 horas





<p>04</p>			<p>Sinalização Vertical – Substrato danificado</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>065+920</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>05</p>			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30cm (medição 40cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>065+960</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>06</p>			<p>Pintura horizontal desgastada sobreposta a antiga causando ilegibilidade</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>067+720</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>





07			<p>Pintura horizontal desgastada sobreposta a antiga causando ilegibilidade</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	067+720	Crescente	72 horas
08			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	070+070	Decrescente	72 horas
09			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	070+700	Decrescente	24 horas





<p>10</p>			<p>Pintura horizontal de legendas em não conformidade com o que especifica o CONTRAN - Vol IV -Manual Sin Horiz</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>073+980</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>11</p>			<p>Pintura horizontal desgastada sobreposta a antiga causando ilegibilidade</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>074+180</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>





12		 <p>13 de nov. de 2024 18:04:40 29.639695S 52.155815W Venancio Aires Vistona RSC 287</p>	<p>Panela no acostamento Item 3.1.1 do PER</p>	074+190	Decrescente	24 horas
13		 <p>13 de nov. de 2024 18:04:20 29.639676S 52.155815W Venancio Aires Vistona RSC 287</p>	<p>Panela no acostamento Item 3.1.1 do PER</p>	074+200	Decrescente	24 horas
14		 <p>13 de nov. de 2024 18:03:45 29.639661S 52.156076W Venancio Aires Vistona RSC 287</p>	<p>Panela no acostamento Item 3.1.1 do PER</p>	074+220	Decrescente	24 horas





15			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	076+580	Decrescente	24 horas
16			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	076+580	Decrescente	72 horas
17			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	081+460	Crescente	72 horas





18		 <p>13 de nov. de 2024 10:19:52 29.656081S 52.228267W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	081+480	Crescente	72 horas
19		 <p>13 de nov. de 2024 10:20:39 29.656127S 52.228457W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	081+490	Crescente	72 horas
20		 <p>13 de nov. de 2024 17:50:02 29.659646S 52.237956W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	082+460	Decrescente	24 horas





21		<p>13 de nov. de 2024 17:50:02 29.659646S -52.237956W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	082+460	Decrescente	72 horas
22		<p>13 de nov. de 2024 17:47:08 29.66273S -52.253108W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	084+000	Decrescente	72 horas
23		<p>13 de nov. de 2024 17:42:30 29.667600S -52.276506W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Ausência de forro no banheiro (SAU)</p> <p>Item 3.4.4 do PER</p>	086+320	Crescente	72 horas





24		<p>18 de nov. de 2024 17:21:43 29.6946075, -52.355270W Visão: RSC-287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	092+350	Decrescente	72 horas
25		<p>13 de nov. de 2024 17:16:55 29.6938115, -52.355379W Visão: RSC-287</p>	<p>Pintura horizontal desgastada sobreposta a antiga causando ilegibilidade</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	094+520	Decrescente	72 horas
26		<p>13 de nov. de 2024 17:18:10 29.6933925, -52.354763W Visão: RSC-287</p>	<p>Pintura horizontal desgastada sobreposta a antiga causando ilegibilidade</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	094+520	Crescente	72 horas





27		<p>13 de nov. de 2024 16:53:49 29.6936975 52.498837W Vera Cruz Vistoria RSC-287</p>	<p>Pintura horizontal desgastada no zebreado (ZPA)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	109+450	Crescente/Decrescente	72 horas
28		<p>13 de nov. de 2024 16:24:18 29.880245 52.716226W Vistoria RSC 287</p>	<p>Ausência de forro no banheiro (SAU)</p> <p>Item 3.4.4 do PER</p>	131+320	Crescente	72 horas
29		<p>13 de nov. de 2024 16:05:02 29.702089S 52.862659W Candelária Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	147+640	Decrescente	72 horas





30		<p>13 de nov. de 2024 15:57:17 29.724919S 52.927384W Candelária Vitoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	154+450	Crescente	72 horas
31		<p>13 de nov. de 2024 15:59:15 29.732336S 52.947044W Novo Cabralo Vitoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	156+540	Crescente	72 horas
32		<p>13 de nov. de 2024 15:31:41 29.744723S 53.148098W Sertão Seco Vitoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	171+660	Decrescente	72 horas






33		 <p>13 de nov. de 2024 15:31:19 29.7447388 53.098260W Restinga Seca Vitoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	171+680	Decrescente	72 horas
34		 <p>13 de nov. de 2024 15:26:14 29.7422809 53.142454W Paraiso do Sul Vitoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	175+970	Decrescente	72 horas
35		 <p>13 de nov. de 2024 15:19:14 29.7272525 53.207405W Açudo Vitoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	182+530	Decrescente	72 horas





36		<p>13 de nov. de 2024 15:11:36 29,7127605 53,260214W Agudo Vitoria RSC-287</p>	<p>Pintura horizontal em cor divergente do que especifica o CONTRAN - Vol IV -Manual Sin Horiz</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	187+930	Crescente/Decrescente	72 horas
37		<p>13 de nov. de 2024 15:09:44 29,7121555 53,262254W Agudo Vitoria RSC-287</p>	<p>Pintura horizontal em cor divergente do que especifica o CONTRAN - Vol IV -Manual Sin Horiz</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	188+280	Crescente/Decrescente	72 horas
38		<p>13 de nov. de 2024 15:01:27 29,7079768 53,310870W Restinga Seca Vitoria RSC 287</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	192+960	Decrescente	24 horas






<p>39</p>		<p>13 de nov. de 2024 14:53:07 29,722506S 53,349399W Restinga Sêca Vistoria RSC-287</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	<p>197+100</p>	<p>Decrescente</p>	<p>24 horas</p>
<p>40</p>		<p>13 de nov. de 2024 14:35:24 29,733004S 53,511315W Restinga Sêca Vistoria RSC-287</p>	<p>Pintura Horizontal Desgastada Item 3.1.2 do PER</p>	<p>213+000</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>





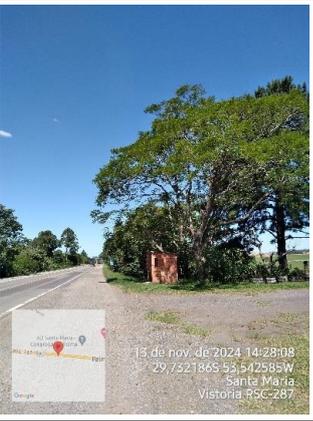

41		 <p>13 de nov. de 2024 14:31:14 29,732540S 53,537862W Santa Maria Vitoria RSC-287</p>  <p>13 de nov. de 2024 14:30:37 29,732527S 53,538282W Santa Maria Vitoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa Serviço Auxiliar de Parada de ônibus</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	215+620	Crescente/Decrescente	72 horas
42		 <p>13 de nov. de 2024 14:28:08 29,732186S 53,542585W Santa Maria Vitoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa Serviço Auxiliar de Parada de ônibus</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	216+160	Crescente/Decrescente	72 horas



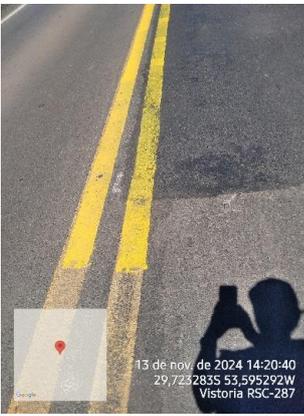

43		 <p>13 de nov. de 2024 14:20:40 29,7232835 53,595292W Vitoria RSC-287</p>	<p>Pintura horizontal em cor divergente do que especifica o CONTRAN - Vol IV -Manual Sin Horiz</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	221+300	Crescente/Decrescente	72 horas
44		 <p>13 de nov. de 2024 14:17:57 29,7210895 53,607375W Santa Maria Vitoria RSC-287</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	222+470	Decrescente	24 horas
45		 <p>13 de nov. de 2024 14:11:22 29,7105885 53,658877W Santa Maria Vitoria RSC-287</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	227+600	Decrescente	24 horas





46		<p>13 de nov. de 2024 14:11:07 29.7105479, -53.659184W Santa Maria Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	227+620	Decrescente	24 horas
47		<p>8 de nov. de 2024 14:06:44 29.7027188, -53.6511694W Santa Maria Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	230+930	Decrescente	72 horas
48		<p>11 de nov. de 2024 14:08:12 29.7026585, -53.6511993W Santa Maria Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	230+960	Decrescente	72 horas





49			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 10 cm em trevo (altura média: 20 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	232+400	Crescente/Decrescente	72 horas
----	--	--	---	---------	-----------------------	----------





2404000009709

Nome do documento: DFCR-RSM-RV-156-2024_Vistoria 14_11_24-rev.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Gracieli Borre	SERG / DFCR / 460830501	18/11/2024 12:03:58
Márcia Roseli Gaber	SERG / DFCR / 4783646	18/11/2024 12:06:35
Maria Cristina Ferreira Passos	SERG / DFCR / 192123101	18/11/2024 13:42:42

